2013年度臨床検査項目標準マスター協議会の課題・スケジュールについて

	課題	明細	推進体制	メンバー（敬称略）	予定	開始日	終了日	2013年6月 上旬	2013年6月 中旬	2013年6月 下旬	2013年7月 上旬	2013年7月 中旬	2013年7月 下旬	2013年8月 上旬	2013年8月 中旬	2013年8月 下旬	2013年9月 上旬	2013年9月 中旬	2013年9月 下旬	2013年10月 上旬	2013年10月 中旬	2013年10月 下旬	2013年11月 上旬	2013年11月 中旬	2013年11月 下旬	2013年12月 上旬	2013年12月 中旬	2013年12月 下旬	2014年1月 上旬	2014年1月 中旬	2014年1月 下旬	2014年2月 上旬	2014年2月 中旬	2014年2月 下旬	2014年3月 上旬	2014年3月 中旬	2014年3月 下旬
会議開催	全体会議				計画	7月19日	7月19日					7/19													11/26												
					実績																																
	改善サブ・共用化サブWG				計画	7月19日	7月19日					7/19													11/26												
					実績																																
	運用体制整備WG				計画	7月19日	7月19日					7/19													11/26												
					実績																																
	（検査項目コード委員会）				計画	7月19日	7月19日					7/19													11/26												
					実績																																
改善サブWG課題	JLAC11(仮称)	検討体制の確定 ※詳細は、JLAC11(仮称)の方向性・検討ステップで、都度、修正する。	運用協議会		計画	6月21日	6月28日																														
					実績	6月21日	6月21日			完了																											
		原理・原則の確定	運用協議会	清水・小須田 （堀田、山田）	計画	7月1日	7月31日																														
					実績																				◎												
		【構成要素単位の詳細検討】 ①分析物の定義、附番方法、その他	検査項目コード委員会 （委員会内のサブWG）	清水・小須田 （堀田、山田）	計画	8月1日	12月31日																														
					実績																				◎												
		【構成要素単位の詳細検討】 ②識別の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
					実績																				◎												
		【構成要素単位の詳細検討】 ③測定法の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
					実績																				◎												
		【構成要素単位の詳細検討】 ④材料の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
					実績																				◎												
		【構成要素単位の詳細検討】 ⑤結果識別の定義、附番方法、その他	同上	同上	計画	8月1日	12月31日																														
					実績																																
		JLAC11(仮称)の頻用コード表の作成 ※JLAC11(仮称)17桁の附番 ※仮に生化学、血液分野 　または、頻用コード表対象150項目	同上	同上	計画	10月1日	3月20日																														
					実績																																
		移行表の作成 （検査名称・JLAC10・JLAC11・診療行為コード）	同上	同上	計画	1月1日	3月20日																														
					実績																																
		JKLC11（仮称）提言書の公開 （提言賞本編、JLAC11頻用コード表、移行表）	運用協議会		計画	3月31日	3月31日																														
					実績																																
	JLAC用一般検査名称	検討体制の確定	運用協議会		計画	6月21日	6月21日																														
					実績																				◎												
		原理・原則の確定	運用協議会	清水・小須田 （堀田、山田）	計画	7月1日	7月31日																														
					実績																				◎												
	JLAC10の改善	課題の抽出	運用協議会	清水・小須田 （堀田、山田） 関連団体(日衛協等)	計画	7月1日	7月31日																														
					実績																																
		各課題の方向性・改善策の検討	運用協議会	清水・小須田 （堀田、山田）	計画	8月1日	11月10日																														
					実績																																
		採用可否の決定	検査項目コード委員会 （委員会内のサブWG）	清水・小須田 （堀田、山田）	計画	11月10日	11月20日																														
					実績																																
		JLAC10&JLAC11頻用コード表コード表への織込み	検査項目コード委員会 （委員会内のサブWG）	清水・小須田 （堀田、山田）	計画	11月21日	2月28日																														
					実績																																

⇒　以降、上段の「分析物～結果識別の定義、附番方法、その他」の課題に吸収し、命名作業を行う。

【20131126;追記】 改善サブWG

(1)検査項目コード委員会での集中討議
・2014年1月に開催予定

(2)JLAC11(仮称)の頻用コード表作成
・前述の集中討議を経て検討
※JLAC10頻用コード表拡充との工数配分

(3)その他
・ 検査受注業者ニーズの反映

【20131126;追記】 改善サブWG

(1)日衛協抽出事項

2013年度臨床検査項目標準マスター協議会の課題・スケジュールについて
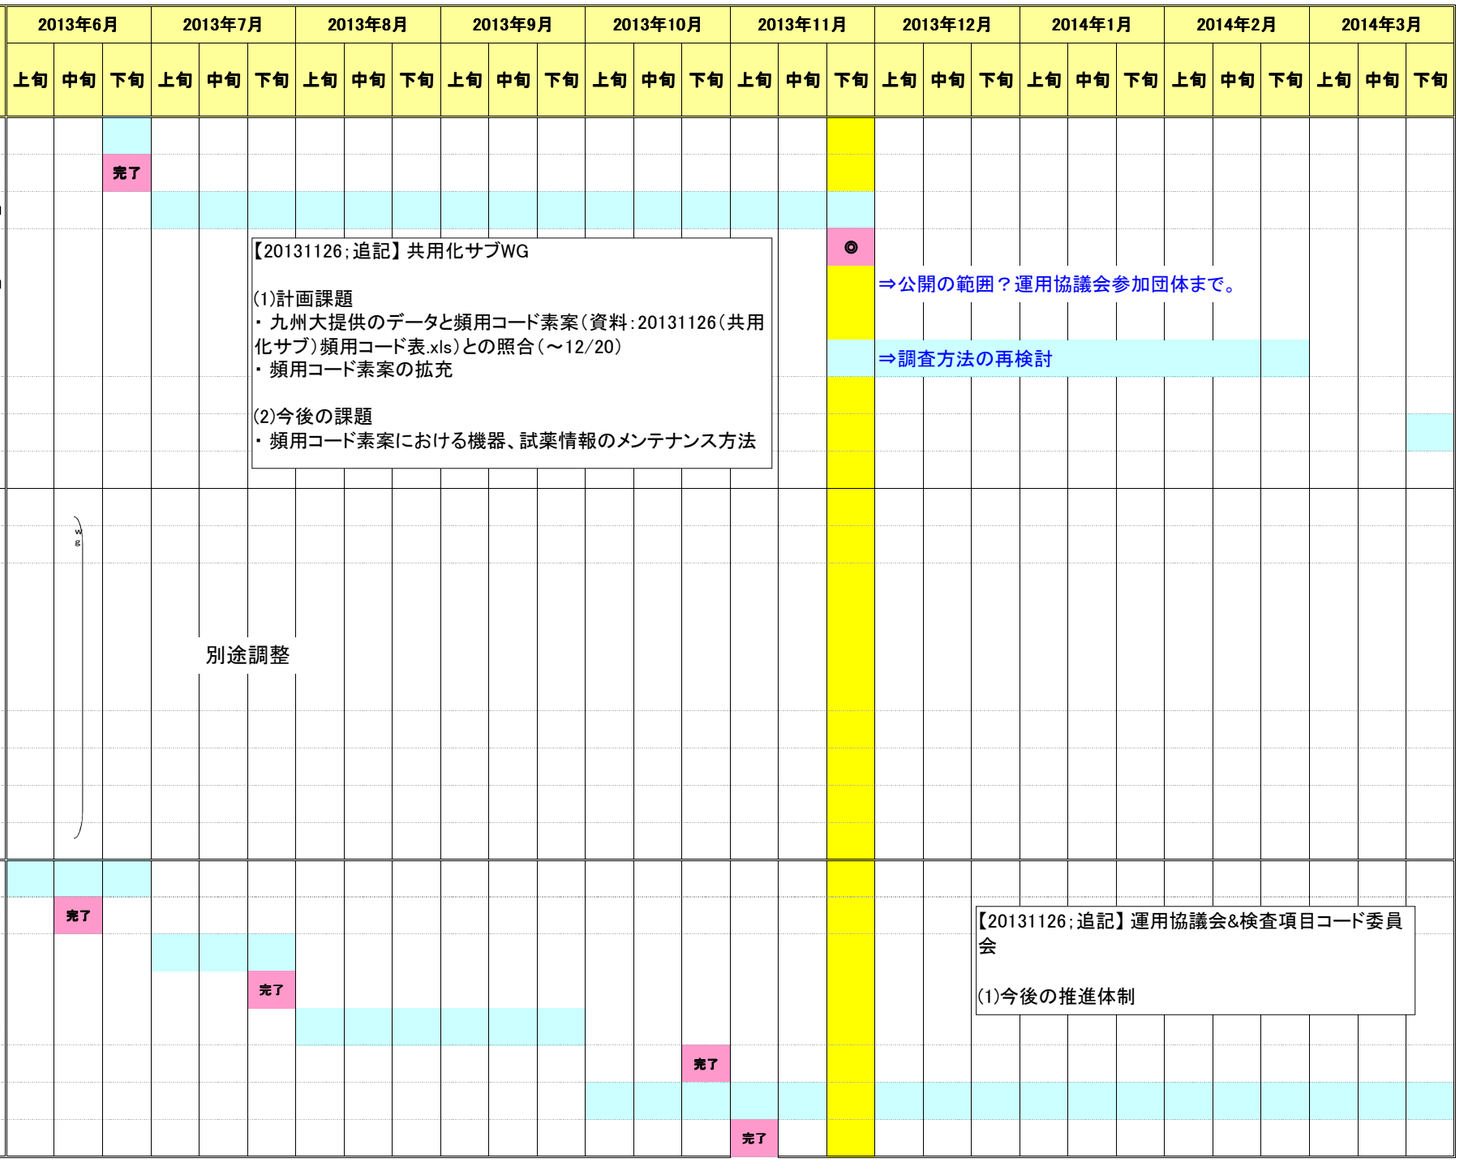
	課題	明細	推進体制	メンバー（敬称略）	予定	開始日	終了日
共用化サブWG	頻用コード表（JLAC10）	検討体制の確定	運用協議会		計画	6月21日	6月28日
					実績	6月21日	6月21日
		頻用コード表作成 ※対象項目は、150項目	検査項目コード委員会（委員会内のサブWG）	堀田・山田（清水・小須田）	計画	7月1日	11月20日
					実績		
		頻用コード表の公開（①）	検査項目コード委員会（委員会内のサブWG）		計画	11月30日	11月30日
					実績		
		頻用コード表対象項目の拡大	検査項目コード委員会（委員会内のサブWG）	堀田・山田（清水、小須田）関連団体(日衛協等)	計画	12月1日	2月28日
					実績		
		頻用コード表の公開（②）	検査項目コード委員会（委員会内のサブWG）		計画	3月31日	3月31日
					実績		
	MEDIS臨床検査マスターの改善	改善の必要性の判断			計画		
					実績		
		改善範囲の確定			計画		
					実績		
		検討体制の確定			計画		
					実績		
		臨床検査マスター新規作成			計画		
					実績		
		臨床検査マスターの公開			計画		
					実績		
運用体制整備WG	JLAC10の早期附番体制	方向性の確定	WGリーダー 臨薬協 MEDIS	大江先生 小出他 山上	計画	6月1日	6月28日
					実績	6月1日	6月10日
		厚生労働省・関連団体との調整	MEDIS	山上	計画	7月1日	7月31日
					実績		
		MEDIS&JSLM、臨薬協　運用体制確定	MEDIS 臨薬協 JSLM	山上 小出他 宮下	計画	8月1日	9月30日
					実績		
		新運用の開始	MEDIS JSLM	山上 宮下	計画	10月1日	
					実績
